


新店耕莘醫院預計施工進度

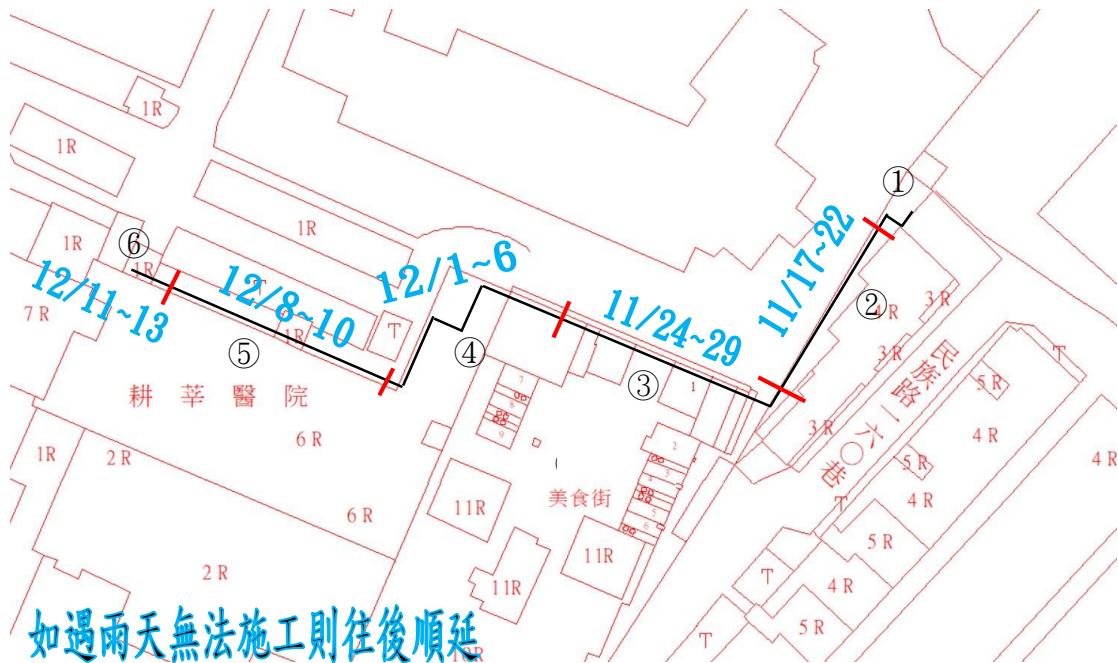

① :與市公所申請路權 12/6 日(星期六)12/13 日(星期六)

挖路施工(工期 1 日)

② : 11/17(一)~11/22(六)配管焊接，通知鷹架準備進場，鷹架施工 1 日

(工期 6 日)

③ :預計 11/24(一)~11/29(六)配管焊接及裝設遮斷閥設備組(工期 6 日)

④ :預計 12/1(一)~12/6(六)配管焊接(工期 6 日)

⑤ :預計 12/8(一)~12/10(三)配管焊接(工期 3 日)

⑥ :預計 12/11(四)~12/13(六)進鍋爐房配管，配管完成後試壓(工期 3 日)

其中①②③④為主要會影響及占用到護校內空間的時段，其餘零星工程例如鷹架下架等僅需佔用短暫時間即可。
